


onsdag, 23. februar 2022

## Informasjon om fremdrift Skallum-Tjernsrud

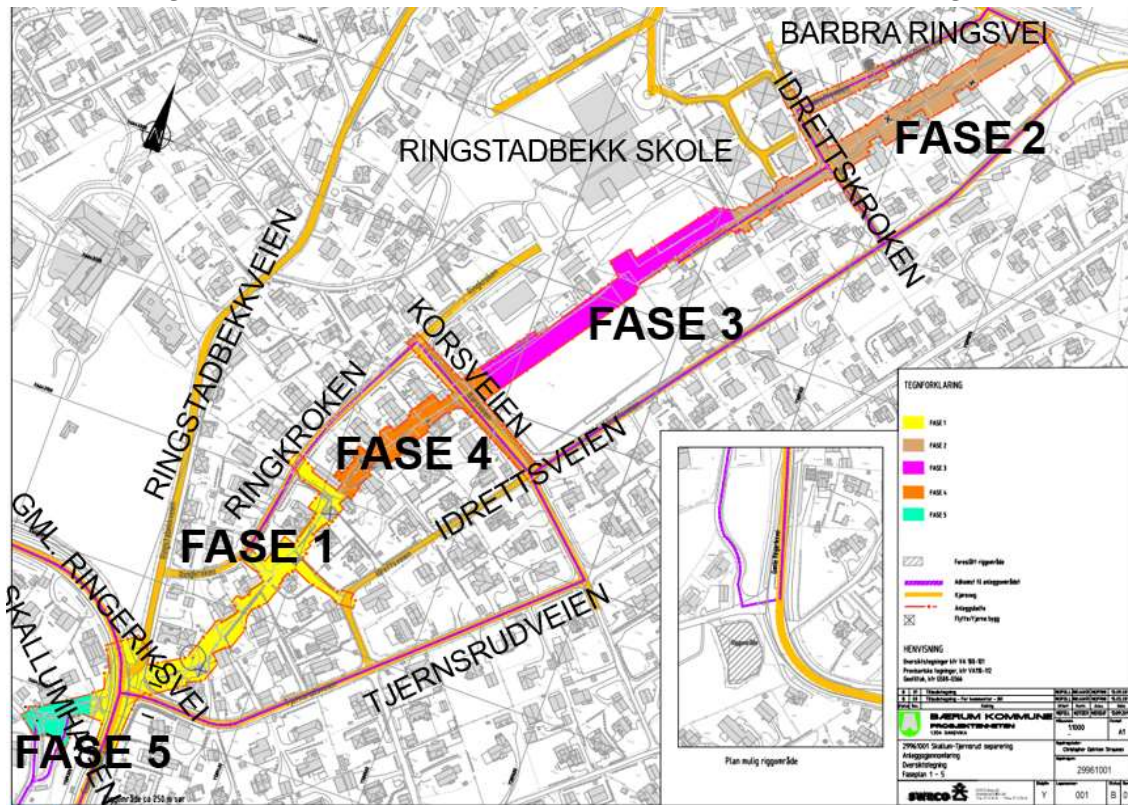

### Fase 1:

Vi jobber iherdig med kryssing av Gml. Ringeriksvei og rørlegging oppover i prosjektet. Arbeidene er krevende da det er mye fjell i området, delvis leirmasser og mye eksisterende infrastruktur som må være forsiktig med. Rørlegging er utført frem til Tjernsrudveien 43 og vi satser på oppstart med videre rørlegging rundt 14. mars.

Arbeider som gjenstår før rør kan legges:

Utgraving av leire og massefortrenging nederst ved Tjernsrudveien 43

Avretting og planering på riktige høyder i spuntgrop

Støp av betongplate på løsmasser i spuntgrop.

Håpet er at det i månedsskiftet mai/juni skal være gjenfylt og oppussing er godt i gang.

### Fase 2:

Foreløpig litt rolig i dette området pr. dags dato. Vi har nylig lagt om litt kabler permanent og provisorisk for fremtidige arbeider. Kabeletatene har lang behandlingstid og alt for lite ressurser så det vil gå litt i rykk og napp da all planlegging avhenger av dem. Gjenstår noe omlegging av tele/internett provisorisk. Foreløpig beregnet oppstart av tyngre arbeider er 24.08.22.

## Fase 3:

Gjelder i hovedsak Stabæk Bandy og Ringstabekk skole. Rørene er ferdig lagt over bandybanen og ca. opp til Idrettskroken 10. I disse dager kobles stikkledning til Ringkroken 21AB. De stikkledningene som er i denne fasen er planlagt ferdig til 30.04.22 og resterende overflate/oppussings arbeider vil være ferdig til 16.05.22. Det skal etableres en kumgruppe helt øverst i denne fasen og disse arbeidene vil nok gå litt over i fase 2. Beboere i Idrettskroken vil få etablert en provisorisk omkjøringsvei når disse arbeidene starter opp, det vil varsles om i god tid slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.

## Fase 4

I denne fasen er vi ferdig med spuntarbeider, kun avstiving av grøften gjenstår. Arbeidene her er litt mer komplisert og er avhengig av en del rekkefølgebestemmelser. Vi venter foreløpig på Elvia slik at vi får etablert strømforsyning til pumpestøtten i Korsveien. Planen er å flytte pumpestøtten fra Ringkroken 3 og overpumpe hele strekket fra Korsveien til Gml. Ringeriksvei. Når pumpene er flyttet kan videre arbeider startes. Det må også etableres en pumpestasjon på stikkledningen til hver eiendom i denne fasen som skal håndtere spillvann. Dette kommer det mer informasjon om når valgt løsning foreligger.

Gjenstående arbeider i den rekkefølgen:

- Flytting av hovedpumper (14.03.22-16.03.22)
- Etablering av pumpestasjoner på hver stikkledning (21.03.22-25.03.22)
- Fjerning av gammel ledning (28.03.22-01.04.22)
- Kalk-stabilisering (04.04.22-20.05.22)
- Rørlegging og igjenfylling (23.05.22-04.08.22) **OBS! 3 uker ferie**
- Ferdigstilling av Korsveien, fortau og kabelgrøfter (08.08.22-01.09.22)

## Fase 5

Arbeidene er stort sett ferdig i denne fasen. Gjenstår oppussing av overflate i Skallumhagen og resetting av kantstein i tillegg til å gjøre ferdig turstien. Det skal også graves ny stikkledning til Gml. Ringeriksvei 14B samt rørførnye den gamle ledningen fra midten av Gml. Ringeriksvei ned til Skallumhagen. Arbeidet forventes helt avsluttet og i stand til 16.05.22.

Stian Rødbøl  
Anleggsleder  
Arne Olav Lund AS  
[s.rodbol@aol.no](mailto:s.rodbol@aol.no)
